

Projekt Sjöstjärnan

Julibrev från Ride gällande ”Projekt Sjöstjärnan”

Hej alla i Sjöberg och Kärrdal! Här kommer ny information från centrumprojektet!

Nu har vi bytt månad och det har blivit juli, vad fort tiden går. Flera av er kanske har på börjat sin semester. Här på projektet fortsätter vi med full fart. I skrivande stund har vi precis börjat montera de första modulerna. De börjar med montage på lilla huset de vi kallar för us A.

På hus A kommer vi kunna smygstarta med arbeten på tak samt fasad under vecka 30. Men dessa arbeten kommer få ta en paus under vecka 32 då vi kommer behöva ta ner tornkranen som då ska ha satt alla moduler på plats.

OBS!! Under vecka 32-34 kommer vi leda om bussarna eftersom det kommer pågå arbeten som innebär att vi behöver spärra av gatan. Hoppas ni alla kommer ha overseende med detta. Vi kommer även sätta upp mer info om detta när det närmar sig på busshållplatsen. Hållplatserna kommer då vara på de ställen där de brukar vara vid omledning. Se bild längre ner i detta utskick.

Ute på arbetsplatsen håller vi på med de sista av montage av prefab väggar på hus B.


Vi har fortfarande problem med folk som tar sig in på nätterna på området. Vi ursäktar för att det låter en del med sirener men det är tyvärr på grund av inbrottsförsök.

Om det är några frågor eller funderingar så tveka inte att hugga tag i någon av oss som går runt i varselkläder. Vi svarar gärna på era frågor och försöker hjälpa till på det sätt vi kan!

Allt gott från oss

Platsledningen TG11 med Entreprenörer!

Projekt Sjästjärnan

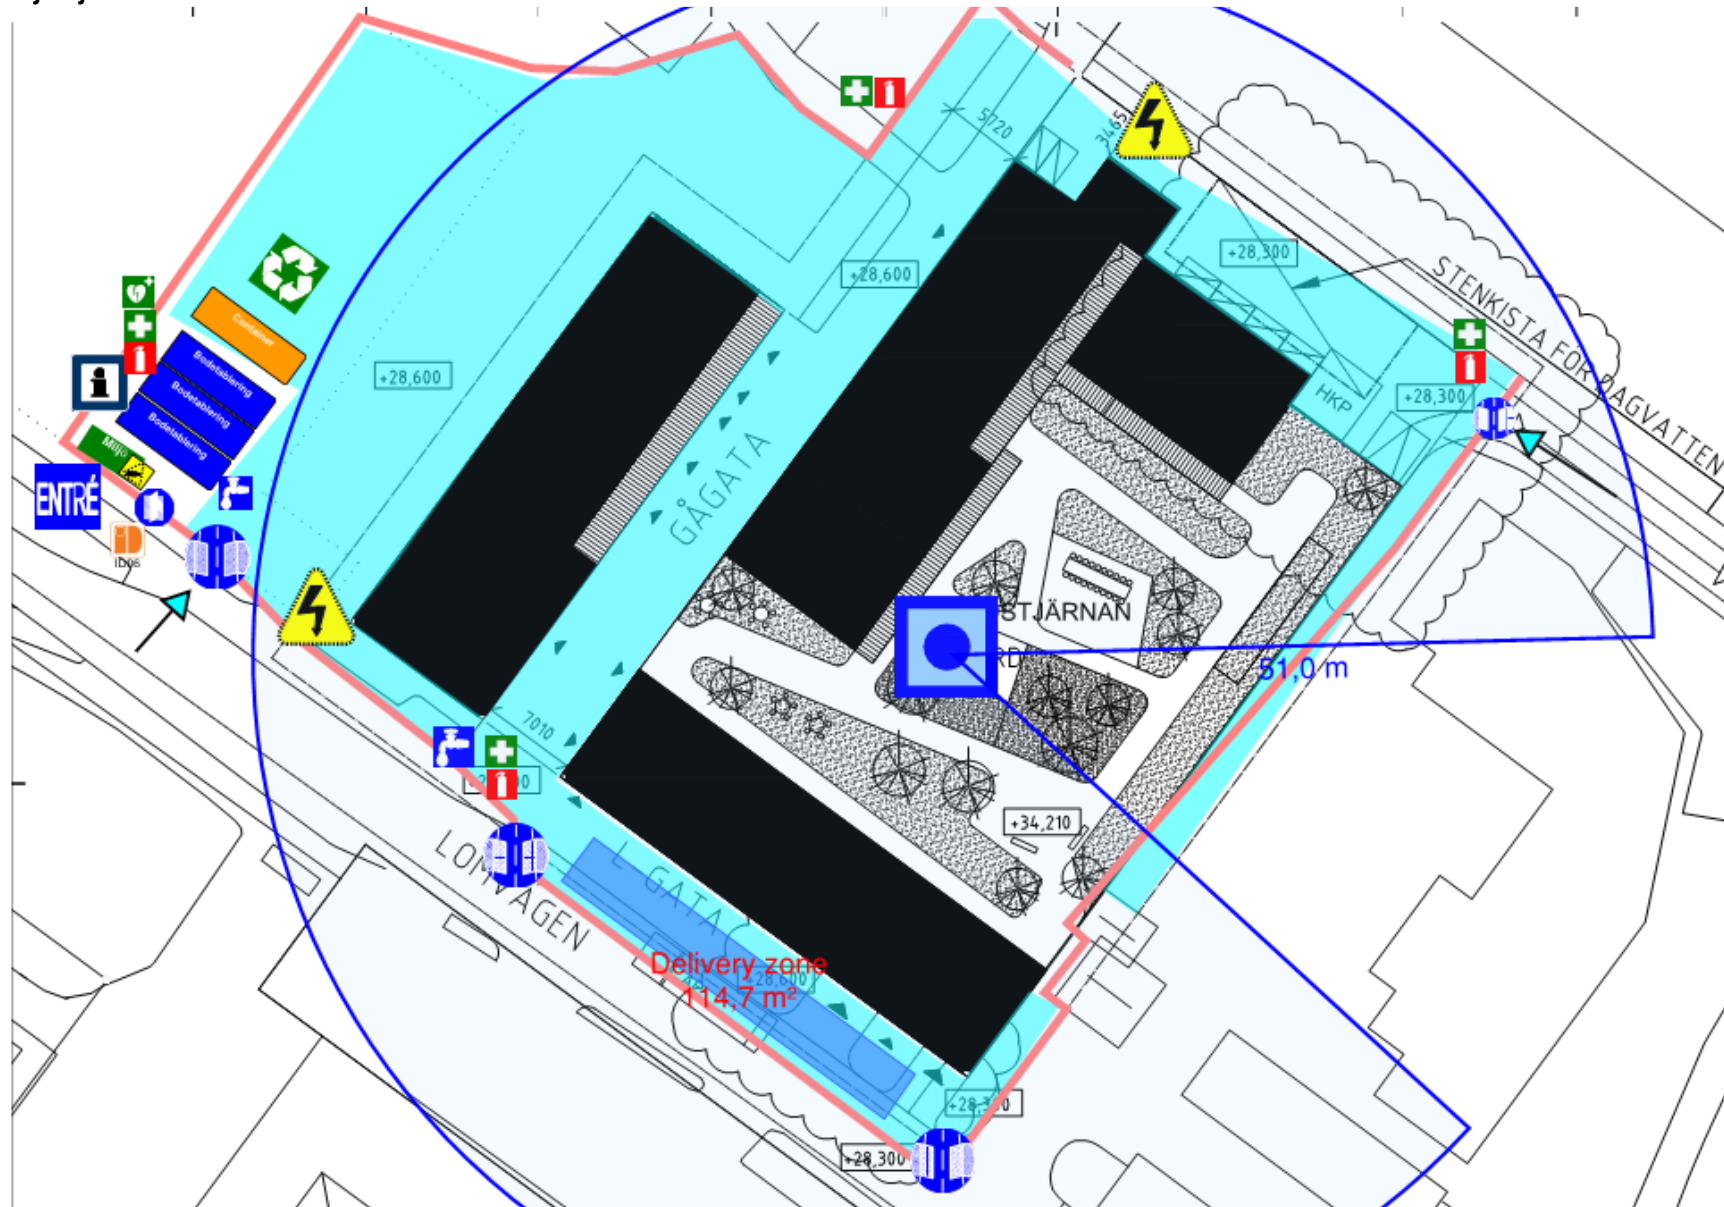

Projekt Sjöstjärnan**Kort info om projektet:****Beställare:** Amasten**Entreprenör:** Ride Entreprenad (TG11 Entreprenad (Defigo) och Riki Bygg)**Byggtid:** Oktober 2019- Januari 2021**Omfattning:** 107 lägenheter och sex kommersiella lokaler fördelat på två huskroppar (**Hus A** som är det mindre där pizzerian tidigare var) och **Hus B** (större byggnaden där Hemköp höll hus). Färdiga lokaler:

- **Hemköp, Sushi, Pizzeria, Kemtält, Gym.**
- **En lokal är inte uthyrd än.**

Kommande veckor är följande planerat:

Hus A

- Modulstart planeras till V.28
- Tak- och fasadarbeten V.30

Hus B

- Stomme- beräknas färdigställas vecka
- Modulstart V.29
- Tak- och fasadarbeten från vecka 33

Projekt Sjöstjärnan

