

Projekt Sjöstjärnan

## Information från projektet

Hej alla i Sjöberg och Kärrdal!

Vi hoppas alla haft en bra jul och fått vila upp sig från 2019 och allt oväsen som vi orsakat.. Nu är vi dock igång igen och kör på för fullt för att hinna klart med pålningen inom en snar framtid. I dagsläget har jobbat vi jobbar ner till drygt 100 pålar som återstår av stora huset. Prognosen säger att vi når detta vecka 8 med den fart vi håller nu. Vi hoppas på att den håller i sig eller blir ännu bättre!

I lilla huset (Hus A) gjuter vi plattan under vecka 4. Sedan kommer det en litet glapp tills stomresningen startar v.10. Det tar cirka tre veckor att resa stommen på lilla huset och därefter är det modulmontage som väntar. Detta är just nu beräknat till slutet av maj.

I stora huset (Hus B) är det pålning och detaljschakt som pågår. Snart börjar vi även med betongarbeten och rörläggning. Det kommer jobbas på för fullt för att hinna med stommontage som börjar på Hus B under vecka 13.


Under sommarmånaderna kommer vi arbeta med tak, fasad och invändiga jobb och sluttiden ligger just nu på inflytt runt jul/nyår 2020.

### **OBS!**

**Vi har de senaste dagarna flyttat ut TA-planen för att få plats för kommande leveranser. Detta gör att körvägen blivit smalare och "enfilig" en kortare sträcka. Vi skulle därmed vilja påminna alla om att försöka hålla sig till den gångbana som är runt parkeringen. Det är för er säkerhet som vi vill att ni använder denna väg. Det kommer vara tunga transporter framöver som innebär risker. Sen är busstrafiken tät så håll er gärna till gångvägen i fortsättningen.**

Om det är något som ni undrar så är ni välkomna att ställa frågor när vi rör oss runt arbetsplatsen!

Projekt Sjöstjärnan

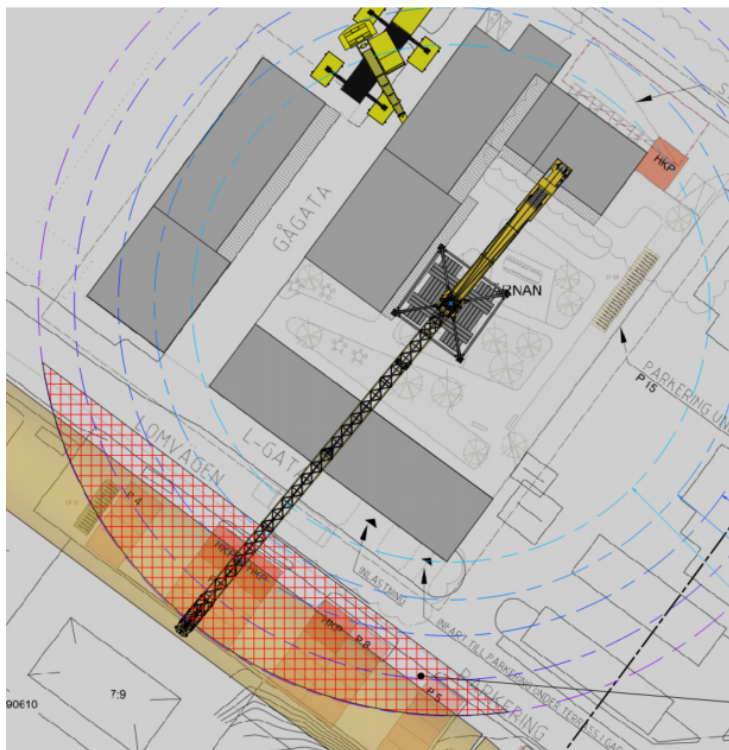

Visuell bild på placering av tornkran för projektet. Mobilkranen kommer enbart vara på plats under resning av kran.

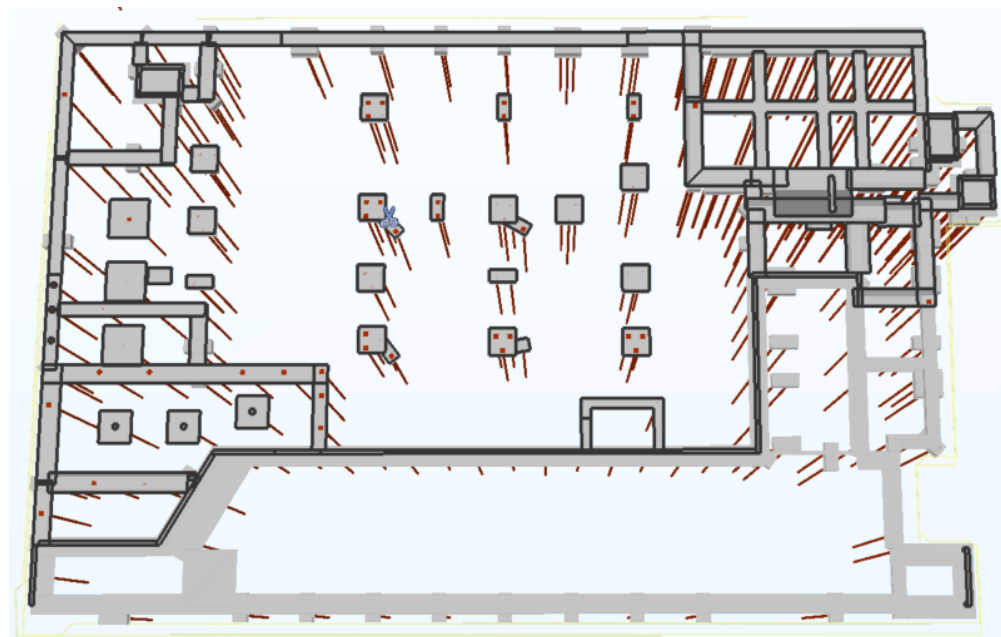


Bild på pålfundament och kantbalkar i Hus B.

Projekt Sjöstjärnan

**Kort info om projektet:****Beställare:** Amasten**Entreprenör:** Ride Entreprenad (TG11 Entreprenad (Defigo) och Riki Bygg)**Byggtid:** Oktober 2019-December 2020**Omfattning:** 107 lägenheter och sex kommersiella lokaler fördelat på två huskroppar (**Hus A** som är det mindre där pizzerian tidigare var) och **Hus B** (större byggnaden där Hemköp höll hus). Läs mer om projektet på [www.amasten.se](http://www.amasten.se)

Kommande veckor är följande planerat:

**Hus A**

- VVS och Betong -v.4
- Stomme v.10-12

**Hus B**

- Pålning -v.8
- VVS och Betong v.4-16
- Stomme v.13-19

**Övrigt**

- Kranmontage under v.9
