Tidsplan i 3 st Etapp

A0003 Garage Kärrdal

Upprättad
2023-06-15

Upprättad av
Kenneth Lindh

Reviderad
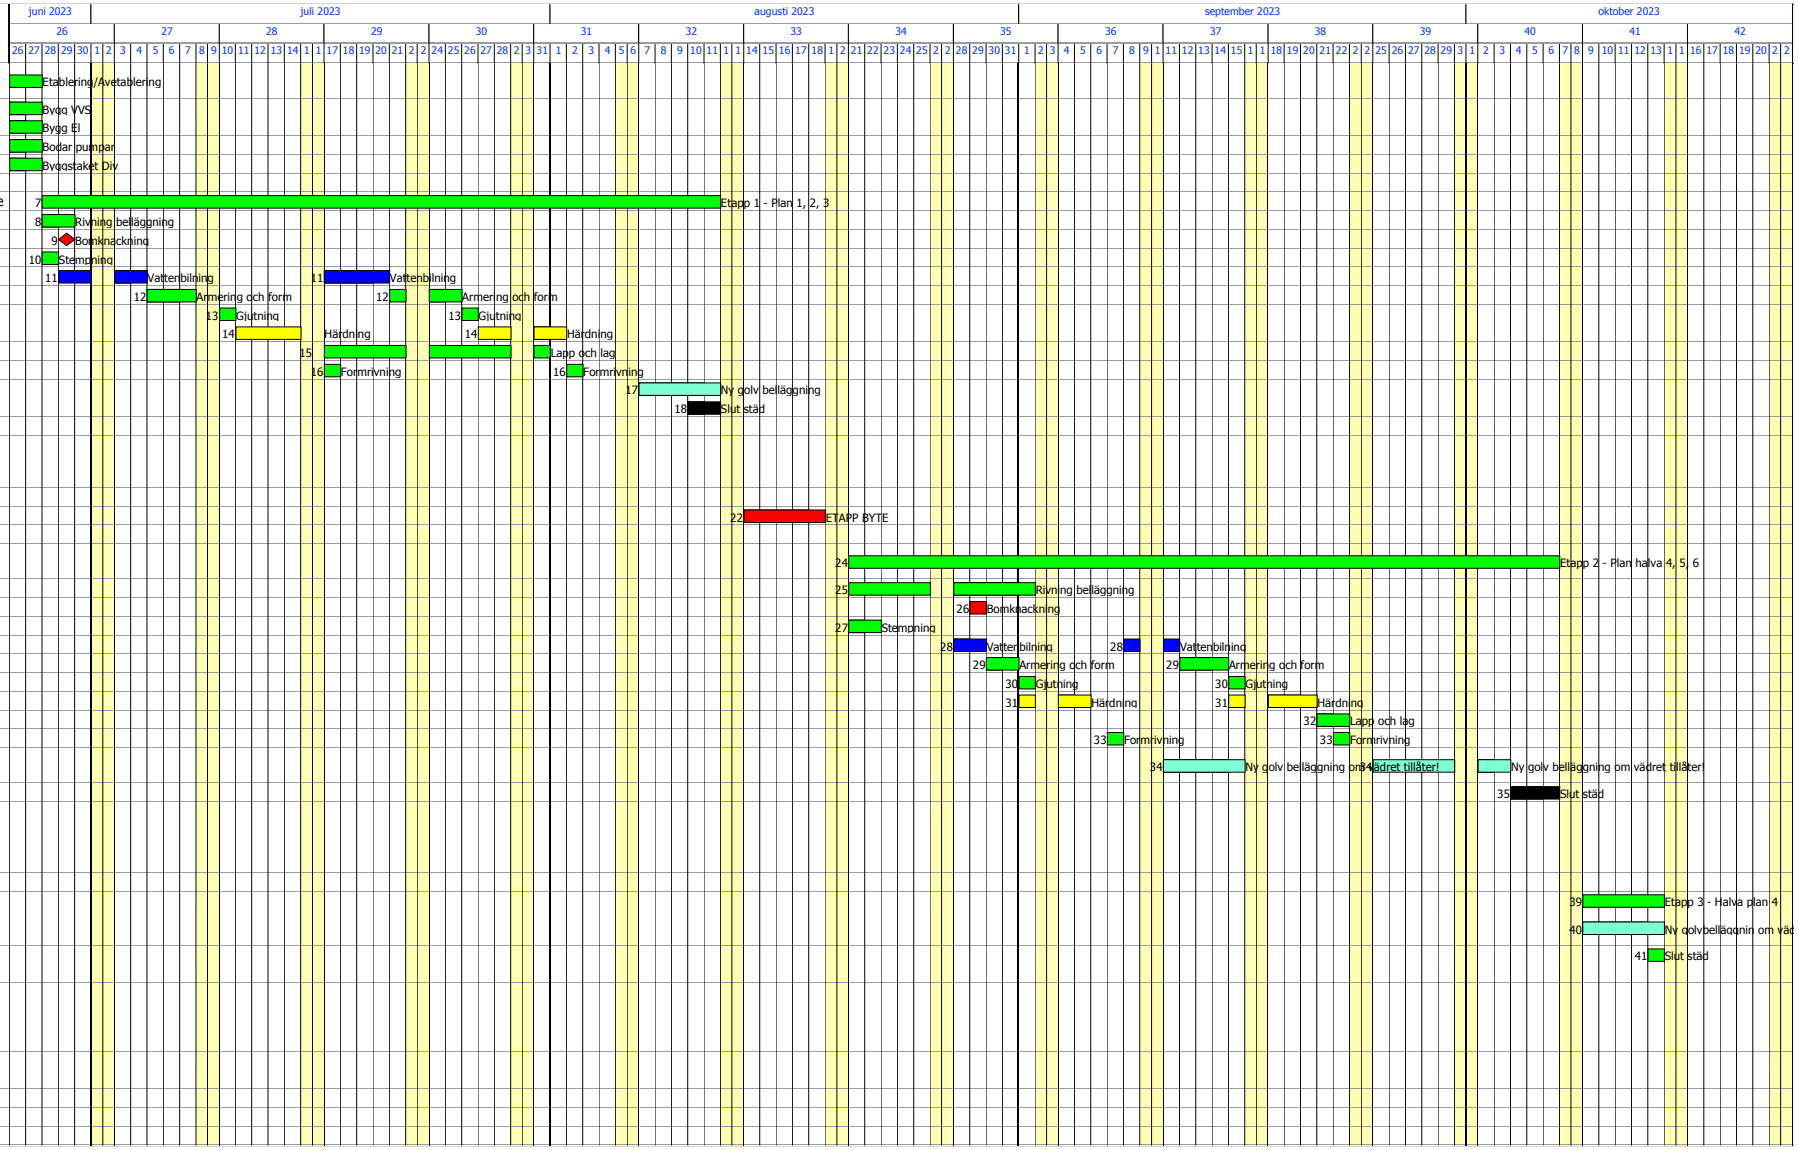
Nr	Akt.nr	Aktivitetsbenämning	Notering
1		**Etablering/Avetablering**	
2		Bygg VVS	
3		Bygg El	
4		Bodar pumpar	
5		Byggstaket Div	
6			
7		**Etapp 1 - Plan 1, 2, 3**	14 st pelare
8		Rivning belläggning	
9		Bomknackning	
10		Stempning	
11		Vattenbilning	
12		Armering och form	
13		Gjutning	
14		Härdning	
15		Lapp och lag	
16		Formrivning	
17		Ny golv belläggning	
18		Slut städ	
19			
20		***När denna etapp går så är det 81 st lediga P-Platser***	
21			
22		ETAPP BYTE	
23			
24		**Etapp 2 - Plan halva 4, 5, 6**	3 st pelare
25		Rivning belläggning	
26		Bomknackning	
27		Stempning	
28		Vattenbilning	
29		Armering och form	
30		Gjutning	
31		Härdning	
32		Lapp och lag	
33		Formrivning	
34		Ny golv belläggning om vädret tillåter!	
35		Slut städ	
36			
37		***När denna etapp går så är det 88 st lediga P-Platser***	
38			
39		**Etapp 3 - Halva plan 4**	
40		Ny golvbelläggnin om väder tillåter!	
41		Slut städ	
42			
43		***När denna etapp går så är det 58 st P-Platser lediga på plan 1 och 2***	
44			
45			
46			
47
