600023 Ombyggnation Utemiljö Etapp 2, Brf Senaten

Upprättad: 2018-08-30
Upprättad av: Lars
Reviderad:
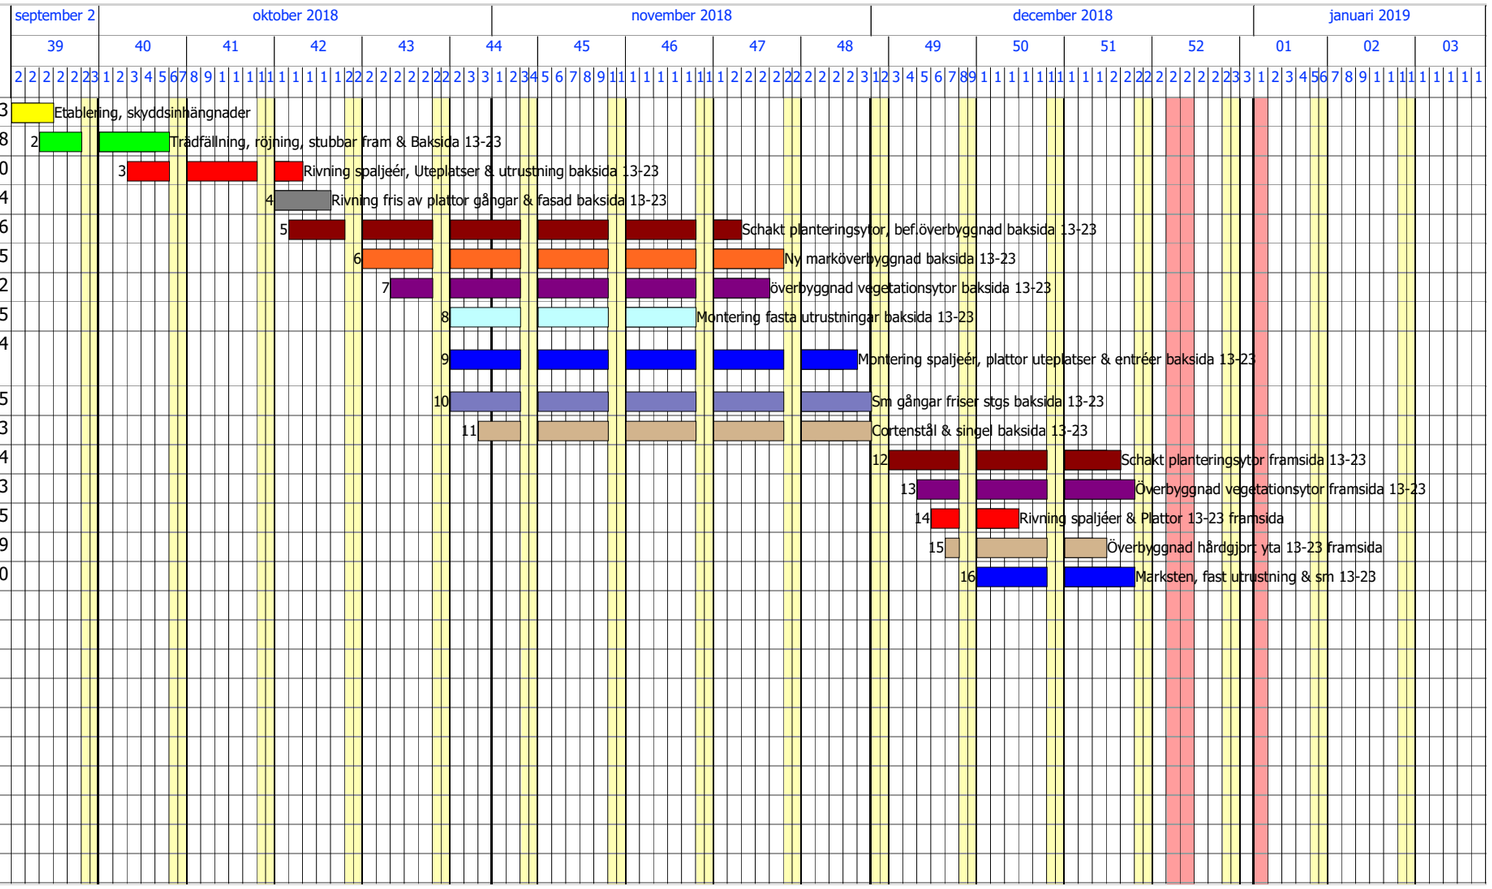
Nr	Akt.nr	Aktivitetsbenämning	Notering	Startdatum	Arbets dagar
1		Etablering, skyddsinhängnader		2018-09-24	3
2		Trädfällning, röjning, stubbar fram & Baksida 13-23		2018-09-26	8
3		Rivning spaljeér, Uteplatser & utrustning baksida 13-23		2018-10-03	10
4		Rivning fris av plattor gångar & fasad baksida 13-23		2018-10-15	4
5		Schakt planteringsytor, bef.överbyggnad baksida 13-23		2018-10-16	26
6		Ny marköverbyggnad baksida 13-23		2018-10-22	25
7		överbyggnad vegetationsytor baksida 13-23		2018-10-24	22
8		Montering fasta utrustningar baksida 13-23		2018-10-29	15
9		Montering spaljeér, plattor uteplatser & entréer baksida 13-23		2018-10-29	24
10		Sm gångar friser stgs baksida 13-23		2018-10-29	25
11		Cortenstål & singel baksida 13-23		2018-10-31	23
12		Schakt planteringsytor framsida 13-23		2018-12-03	14
13		Överbyggnad vegetationsytor framsida 13-23		2018-12-05	13
14		Rivning spaljéer & Plattor 13-23 framsida		2018-12-06	5
15		Överbyggnad hårdgjort yta 13-23 framsida		2018-12-07	9
16		Marksten, fast utrustning & sm 13-23		2018-12-10	10
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25
